AuroraCare

Carta Gantt del proyecto

Fundamentos y arquitectura

Corte: 23 de octubre de 2026

49 tareas principales · 178 subtareas de respaldo

J = fechas propias de Jira M = fecha propia + rango del sprint S = rango del sprint P = propuesta

Las fechas M, S y P requieren validación. El avance cuenta subtareas; no mide esfuerzo ni duración real.

Clave	Actividad principal	Responsable	Inicio	Término	Avance	Fechas
Sprint 1: Fundamentos						
SCRUM-5	Instalar stack en los equipos de desarrollo	Daniela	31/08	05/09	100%	**J**
SCRUM-6	Configurar repositorio GitHub	Daniela	31/08	13/09	100%	**M**
SCRUM-7	Crear proyecto Firebase	Daniela	31/08	13/09	100%	**M**
SCRUM-8	Spike técnico Flutter -> FastAPI -> OpenAI	Daniela	02/09	13/09	100%	**J**
SCRUM-9	Configurar Jira	Daniela	31/08	05/09	100%	**M**
SCRUM-10	Reunión de kickoff del equipo	Daniela	31/08	10/09	100%	**M**
Sprint 2: Arquitectura y autenticación						
SCRUM-14	Estructura de capas Flutter	Daniela	08/09	22/09	100%	**M**
SCRUM-15	Tema visual AuroraCare	Benjamín	08/09	22/09	100%	**M**
SCRUM-16	Pantalla de Bienvenida y Login	Benjamín	08/09	26/09	100%	**M**
SCRUM-17	Disclaimer médico en onboarding	Benjamín	08/09	26/09	100%	**M**
SCRUM-18	Selección de modo de uso	Benjamín	08/09	30/09	100%	**M**
SCRUM-19	Generación UUID anónimo	Daniela	08/09	28/09	100%	**M**
SCRUM-20	Prototipo Figma - Flujos Completos 9 - 12	Daniela	08/09	04/10	100%	**M**
SCRUM-85	Registro de Cuidador	Eduardo	08/09	30/09	100%	**M**
SCRUM-124	Desbloqueo de Tareas de Programación	Daniela	08/09	04/10	100%	**M**
SCRUM-129	Prototipo Figma - Flujos Completos 1-4	Benjamín	08/09	06/10	100%	**M**
SCRUM-130	Prototipo Figma - Flujos Completos 5 - 8	Eduardo	08/09	06/10	100%	**M**
SCRUM-139	Paso a Producción - Merge Develop -> Main	Daniela	08/09	06/10	100%	**S**

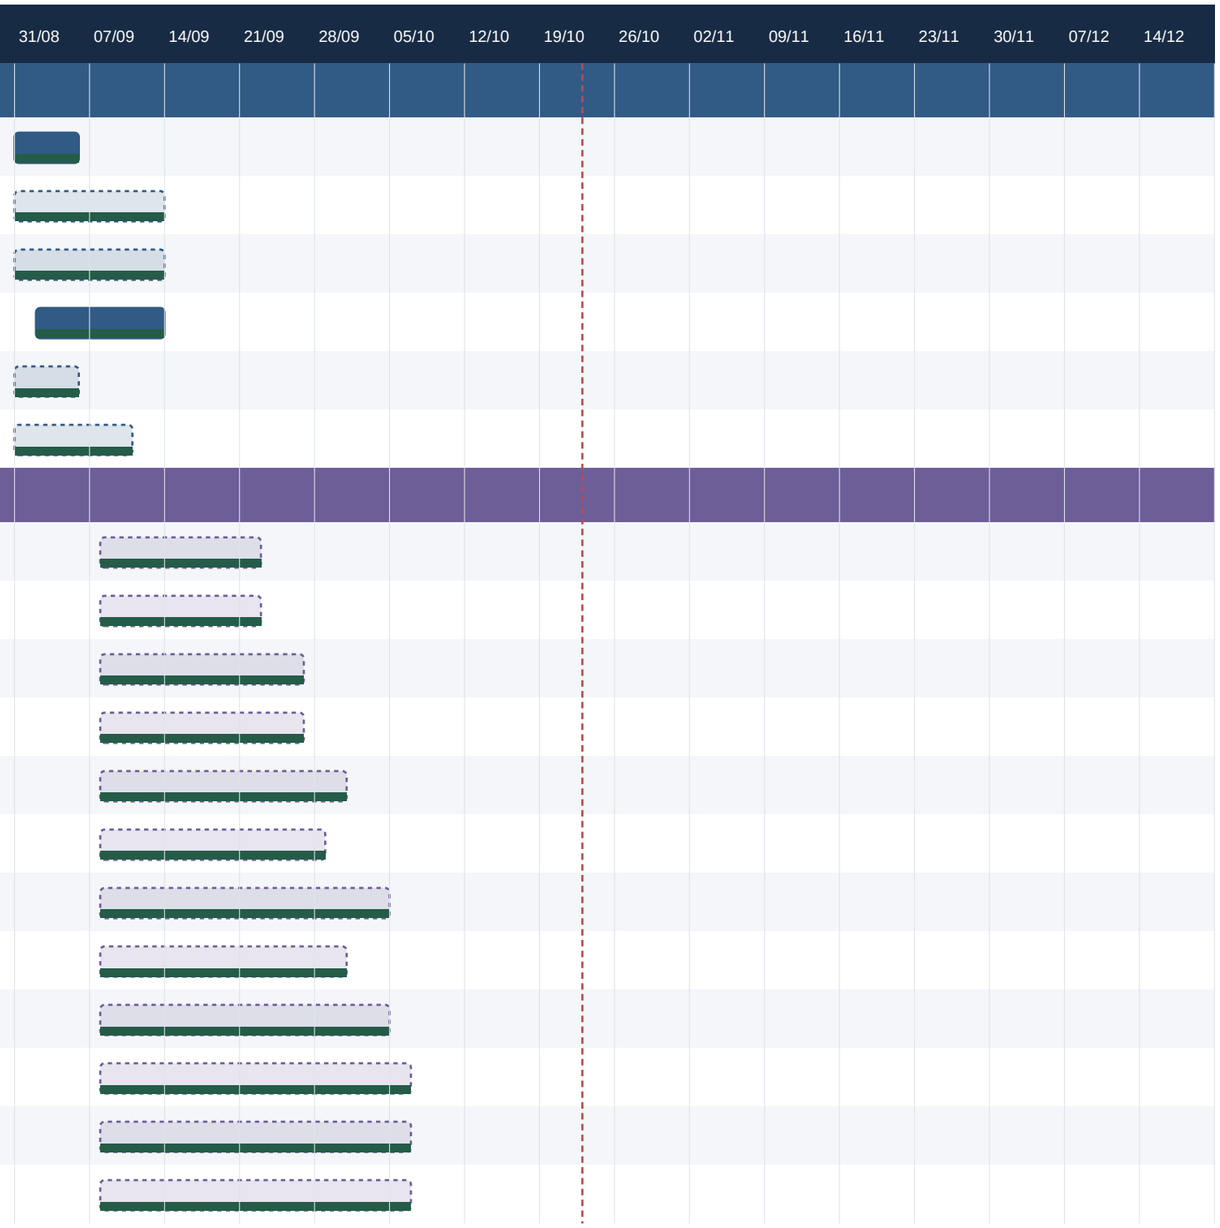

Fuentes: Jira SCRUM (consulta 23/10/2026) y README de GitHub Project AuroraCare.

Sin fechas reales de inicio/cierre verificadas. Dependencias y fechas suplidas quedan por validar con el equipo.

AuroraCare

Carta Gantt del proyecto

Juegos, métricas y mejoras de la app

Corte: 23 de octubre de 2026

49 tareas principales · 178 subtareas de respaldo

J = fechas propias de Jira M = fecha propia + rango del sprint S = rango del sprint P = propuesta

Las fechas M, S y P requieren validación. El avance cuenta subtareas; no mide esfuerzo ni duración real.

Clave	Actividad principal	Responsable	Inicio	Término	Avance	Fechas
Sprint 3: Juegos y métricas						
SCRUM-21	Juegos (Memoria)	Benjamín	12/10	23/10	0%	**J**
SCRUM-22	Juegos (Praxias)	Daniela	12/10	23/10	100%	**J**
SCRUM-23	Juegos (Atención)	Eduardo	12/10	23/10	80%	**J**
SCRUM-24	Módulo de respiración guiada	Benjamín	12/10	23/10	100%	**J**
SCRUM-25	Captura de métricas por sesión	Daniela	05/10	13/10	100%	**J**
SCRUM-26	Pruebas QA	Eduardo	23/10	25/10	0%	**J**
SCRUM-28	FastAPI - endpoint/session/analyze	Daniela	07/10	13/10	100%	**J**
SCRUM-76	Configurar Firebase Storage	Daniela	06/10	13/10	100%	**J**
SCRUM-201	Documentación para Fase 2	Daniela	07/10	24/10	s/d	**J**
SCRUM-216	Eliminar el modo "Solo jugar" y adaptar la app a 2 modos de uso	Benjamín	01/10	13/10	100%	**M**
SCRUM-217	Indicar con claridad dónde está el error al crear cuenta e iniciar sesión	Benjamín	01/10	13/10	100%	**M**
SCRUM-218	Mantener la sesión iniciada al volver a abrir la app	Benjamín	01/10	13/10	100%	**M**

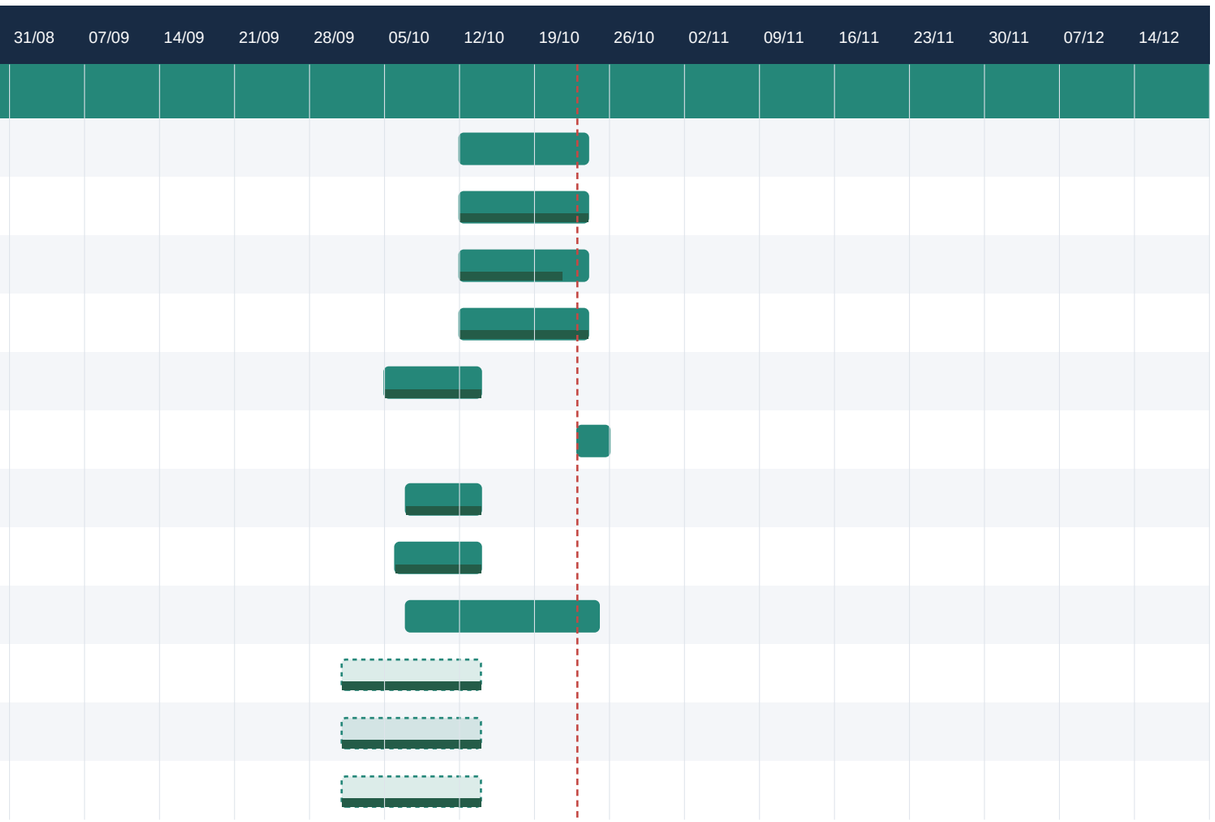

Fuentes: Jira SCRUM (consulta 23/10/2026) y README de GitHub Project AuroraCare.

Sin fechas reales de inicio/cierre verificadas. Dependencias y fechas suplidas quedan por validar con el equipo.

AuroraCare

Carta Gantt del proyecto

Cuidador, privacidad y entrega

Corte: 23 de octubre de 2026

49 tareas principales · 178 subtareas de respaldo

J = fechas propias de Jira M = fecha propia + rango del sprint S = rango del sprint P = propuesta

Las fechas M, S y P requieren validación. El avance cuenta subtareas; no mide esfuerzo ni duración real.

Clave	Actividad principal	Responsable	Inicio	Término	Avance	Fechas
Sprint 4: Módulo cuidador y QR						
SCRUM-29	Primera sesión de prueba con usuarios	Daniela	26/10	15/11	0%	**S**
SCRUM-30	Generación de QR por adulto mayor	Daniela	26/10	15/11	0%	**S**
SCRUM-31	Escaneo de QR por cuidador	Eduardo	26/10	15/11	0%	**S**
SCRUM-32	Dashboard cuidador	Eduardo	26/10	15/11	0%	**S**
SCRUM-33	Historial de resultados	Eduardo	26/10	15/11	0%	**S**
SCRUM-34	Notificación push al cuidador	Eduardo	26/10	15/11	0%	**S**
SCRUM-35	Vista de progreso personal	Benjamín	26/10	15/11	0%	**S**
SCRUM-36	FastAPI - endpoint/report/generate	Daniela	26/10	15/11	0%	**S**
SCRUM-37	Pruebas QA	Eduardo	26/10	15/11	0%	**S**
SCRUM-38	Segunda sesión de pruebas con usuarios	Daniela	26/10	15/11	0%	**S**
Sprint 5: Privacidad, reporte y publicación						
SCRUM-39	flujo ARCO completo	Daniela	16/11	06/12	0%	**S**
SCRUM-40	Desvinculación del cuidador	Eduardo	16/11	06/12	0%	**S**
SCRUM-41	Reporte PDF exportable	Eduardo	16/11	06/12	0%	**S**
SCRUM-42	Auditoría de lenguaje en toda la app	Benjamín	16/11	06/12	0%	**S**
SCRUM-43	Pruebas de rendimiento en gama baja	Benjamín	16/11	06/12	0%	**S**
SCRUM-44	Pruebas QA	Eduardo	16/11	06/12	0%	**S**
SCRUM-45	Tercera sesión de prueba con usuarios	Daniela	16/11	06/12	0%	**S**
SCRUM-46	Build de producción y publicación Play Store	Daniela	16/11	06/12	0%	**S**
SCRUM-47	Documentación final para transferencia	Daniela	16/11	06/12	0%	**S**
Cierre propuesto - fuera de los sprints registrados						
PROP-01	Cierre, defensa y transferencia final	Equipo	07/12	20/12	s/d	**P**

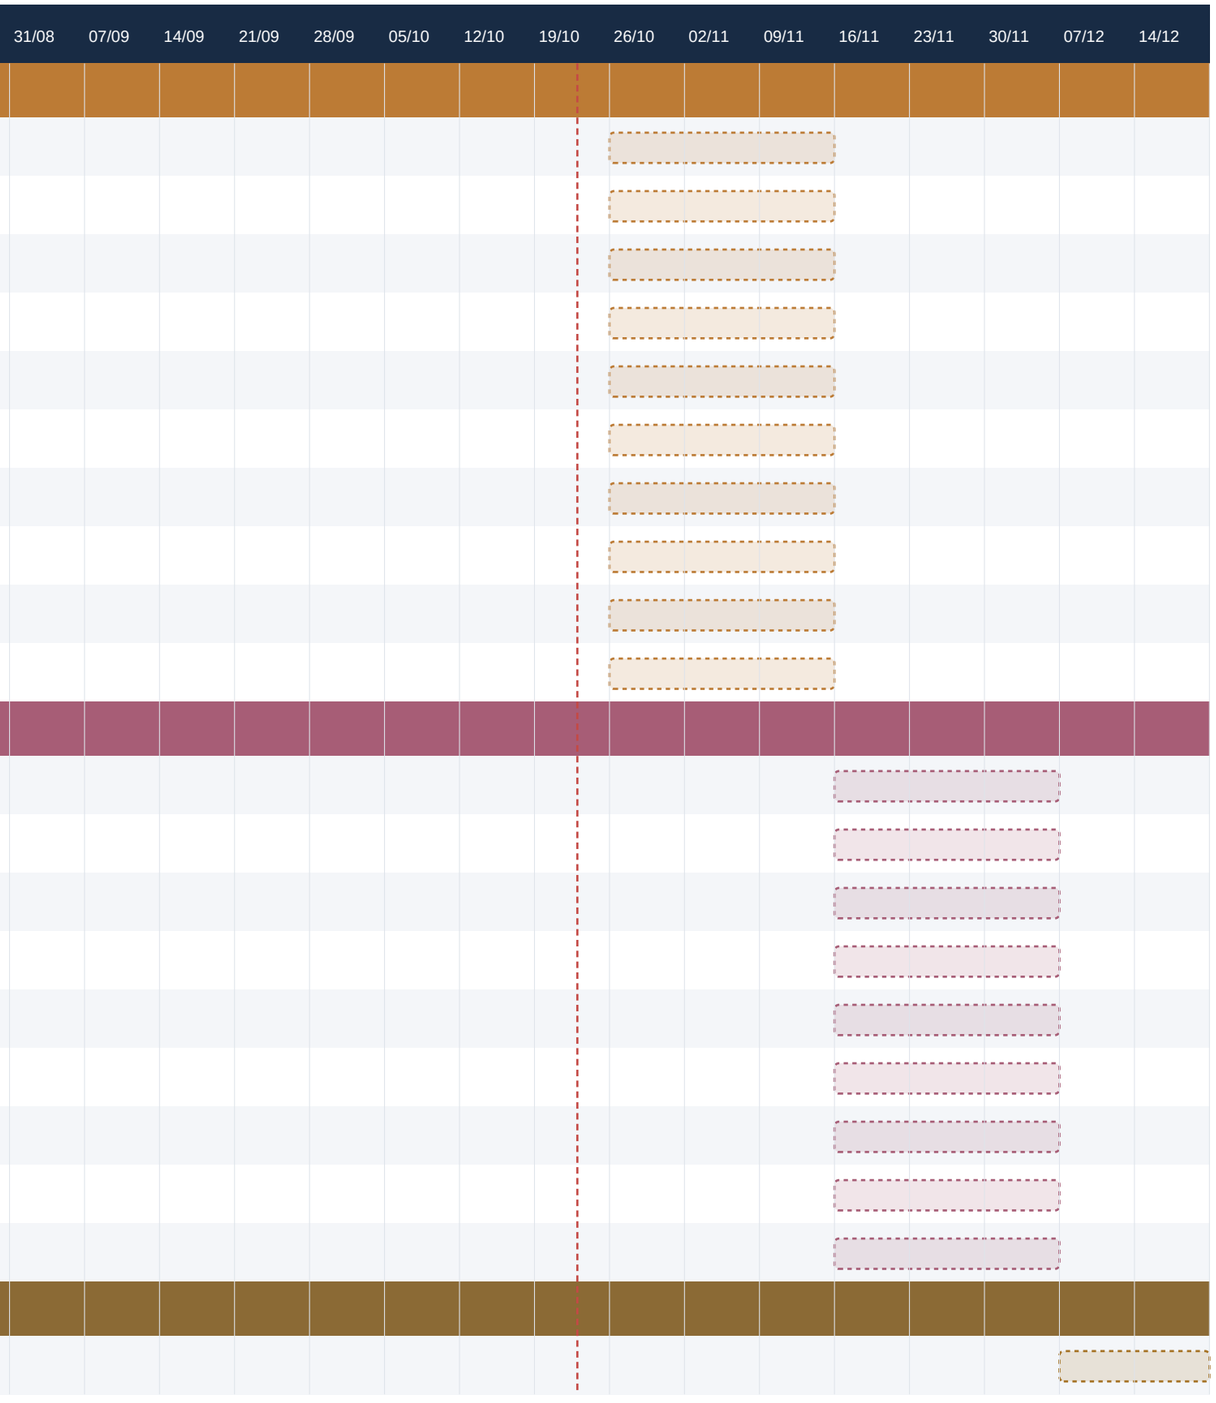

Fuentes: Jira SCRUM (consulta 23/10/2026) y README de GitHub Project AuroraCare.

Sin fechas reales de inicio/cierre verificadas. Dependencias y fechas suplidas quedan por validar con el equipo.
